


Data publikacji

13 października 2022

Autor

Administrator

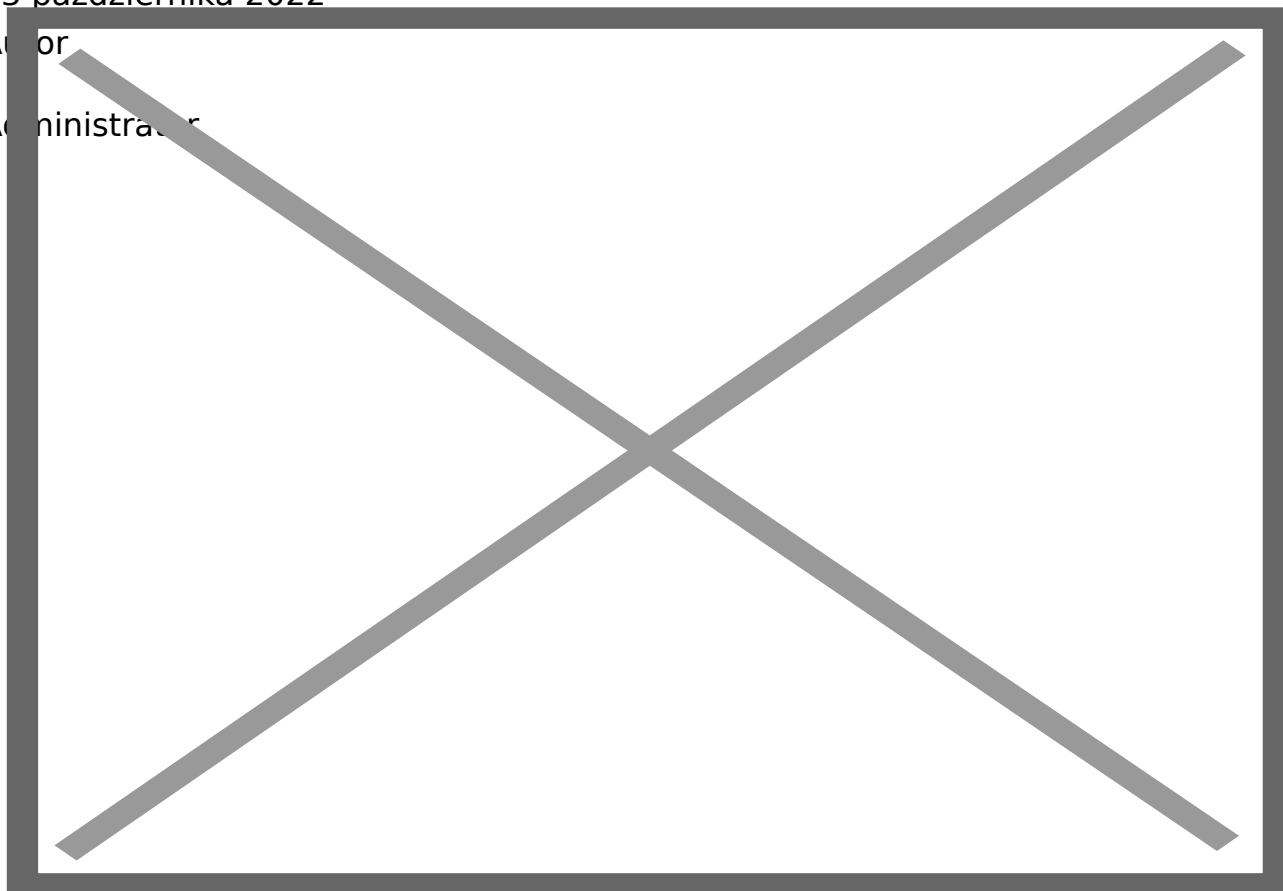

Trwa budowa Pszczyńskiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że przy ulicy Bielskiej powstaną między innymi: sala widowiskowa na 500 osób, sala kinowa mieszcząca około 150 osób oraz liczne sale warsztatowe. Wokół obiektu powstaną zagospodarowane tereny zielone. Zobaczcie, co działo się w tym miejscu w ostatnich tygodniach.

Bryła budynku Pszczyńskiego Centrum Kultury powoli nabiera ostatecznego kształtu. We wrześniu powstała żelbetowa konstrukcja sali widowiskowej. Wybetonowano, do projektowanej wysokości ściany nad salą taneczną. Zabetonowano także strop nad budynkiem technicznym, nad częścią restauracyjną parteru i nad korytarzem 2 piętra.

Cały czas kontynuowane są prace nad wznoszeniem kolejnych ścian sali widowiskowej do docelowej wysokości. Scalono dostarczone na teren budowy stalowe dźwigary konstrukcji

dachu , które zostaną niebawem zamontowane nad Salą widowiskową.

To nie koniec nowych działań. Końcem września rozpoczęto prace dekarские na dachu, nad częścią administracyjną i szatniami. Przystąpiono również do pierwszych prac związanych z instalacją wentylacyjną wewnątrz obiektu.

Nie da się ukryć, że wrzesień nie rozpieszczał pod kątem pogody - było deszczowo i nieprzyjemnie. To jednak nie przeszkodziło budowlańcom, którzy po tych kilku mokrych tygodniach, na horyzoncie wypatrują ciepłej złotej jesieni.

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)
