


Data publikacji
08 listopada 2022

Autor

Administrator

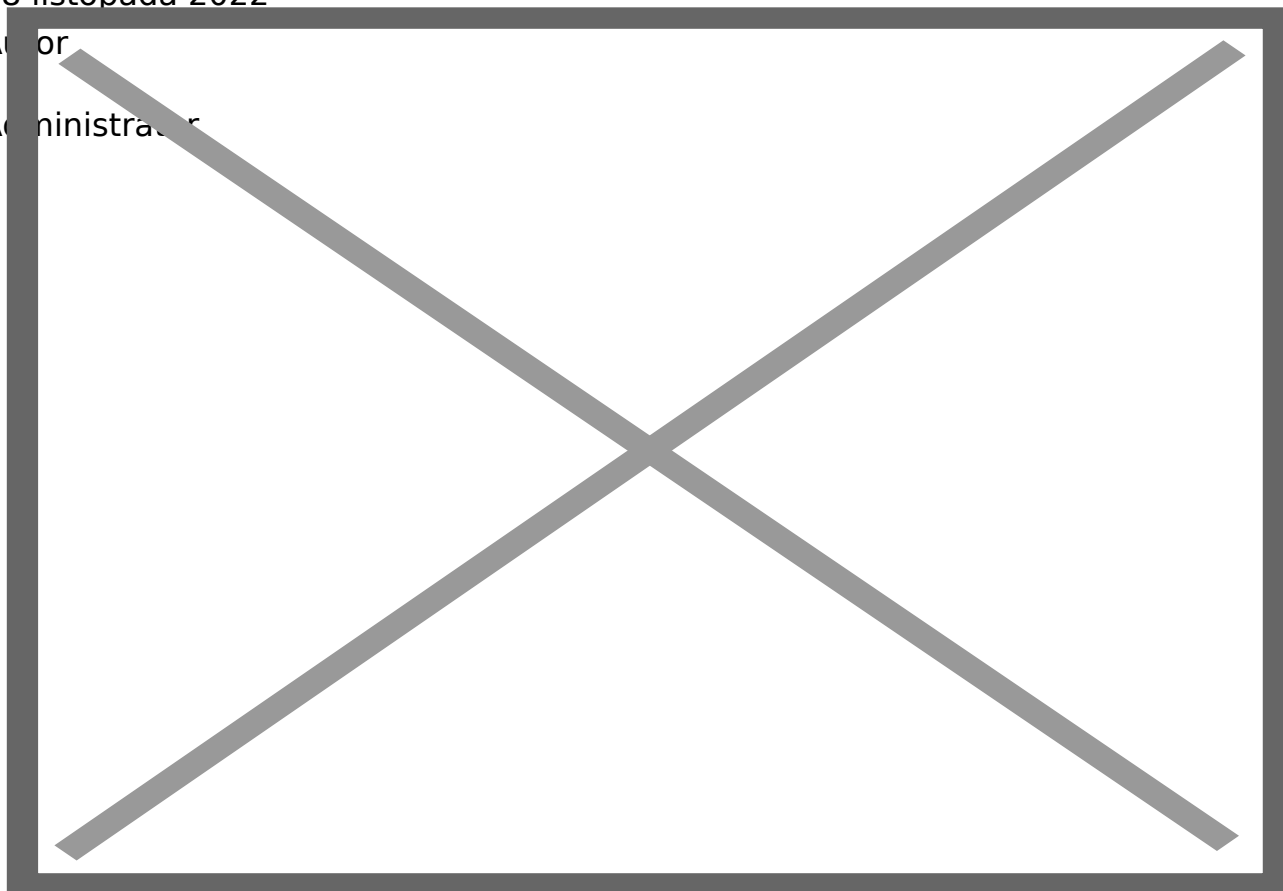

Prace na budowie Pszczyńskiego Centrum Kultury wchodzą w nową fazę. Patrząc zza ogrodzenia posesji nie będzie już większych zmian, ponieważ prace w większości skupiają się wewnątrz obiektu.

W październiku kontynuowano prace murarskie, dekarские, wentylacyjne oraz elektryczne. Rozpoczęto również tynkowanie ścian, montaż instalacji sanitarnych oraz przygotowanie do montażu fasady szklanej w północnej części budynku głównego.

Roboty żelbetowe zbliżają się już powoli ku końcowi. W tym miesiącu zabetonowano drugą część stropu skrzynkowego oraz wykonano betonowe ściany wraz z stropami pomieszczeń technicznych sali widowiskowej oraz kinowej. Kolejny etap objął wykonanie żelbetowych ścian sali warsztatowej oraz ułożenie na nich prefabrykowanych płyt betonowych. Wykorzystano do tego potężny dźwig kołowy o masie 73 ton i udźwigu 250

ton. Z wykorzystaniem tego samego ciężkiego sprzętu została również zamontowana konstrukcja stalowa nad salą widowiskową, którą uprzednio zabezpieczono przeciwpożarowo. Wyłożono na niej warstwę nośną w postaci blachy trapezowej.

Na stropie nad częścią administracyjną ułożono termoizolację oraz wysypano wierzchnią warstwę żwiru. Jest to nietypowy układ warstw cechujący system dachu odwróconego. Prace dekarские objęły także strop budynku technicznego oraz nad salą taneczną, gdzie wykonano warstwę hydroizolacji. W październiku na terenie budowy kontynuowano także prace ziemne. Wykonano nasyp za murem oporowym oraz podbudowę dla chodników w dziedzińcu. Rozpoczęto również kształtowanie amfiteatru.

Pomimo zbliżającej się zimy budowlańcy snują ambitne plany kontynuacji robót. Po deszczowym wrześniu, październik przywitał pracowników prawdziwą złotą jesienią. To dodało optymizmu. Wszyscy liczą, że i listopad będzie równie słoneczny, co pozwoli wykonać wiele kluczowych prac przed solidnymi mrozami.

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)
