


Data publikacji
08 grudnia 2022

Autor

Administrator

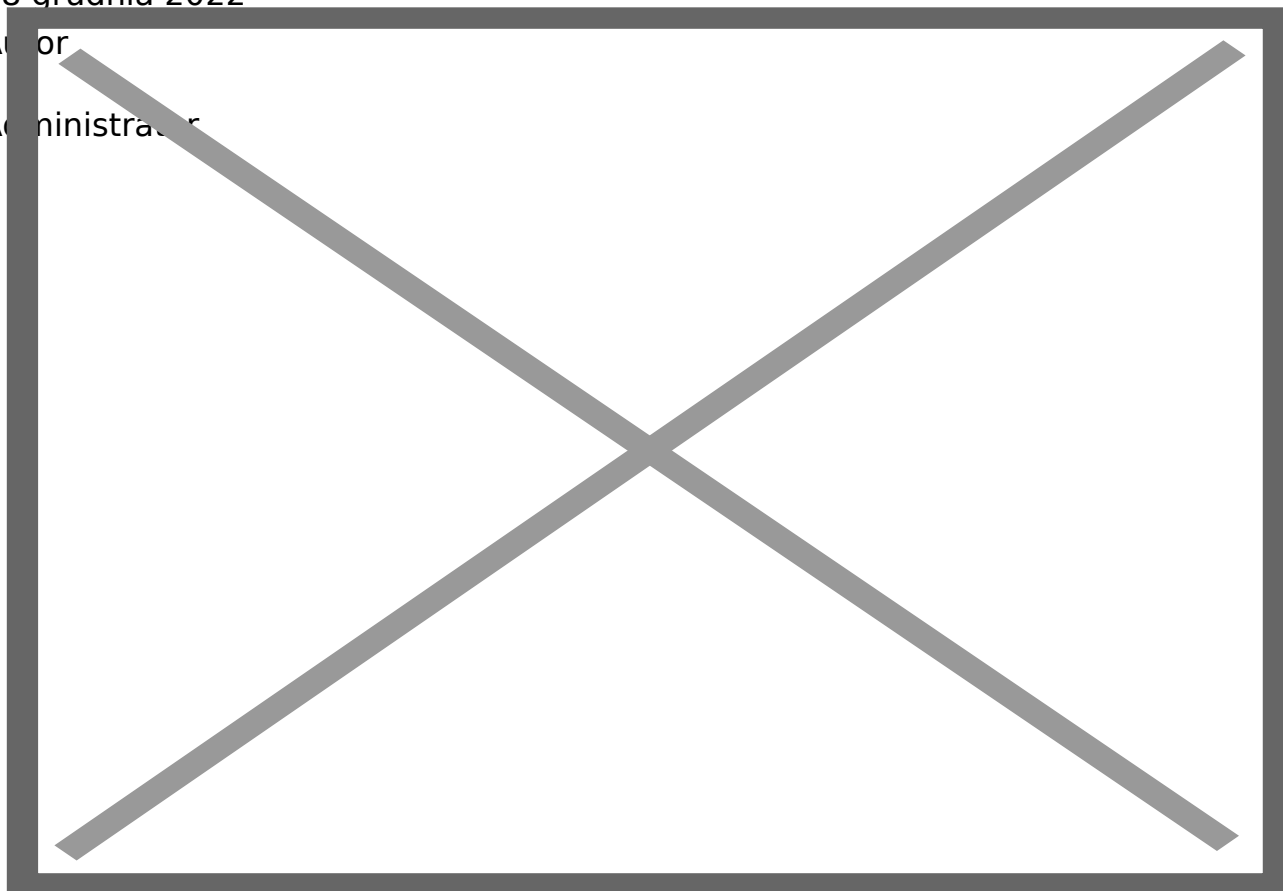

Na budowie Pszczyńskiego Centrum Kultury listopad przywitał budowlańców zimową aurą. Pomimo nocnych przymrozków oraz pierwszych opadów śniegu, wszystkie prace były kontynuowane zgodnie z planem.

Ważnym etapem było zakończenie prac żelbetowych. Trwały one 10 miesięcy. Liczby robią wrażenie - niemal 3900 m³ mieszanki betonowej oraz niespełna 300 ton stal. Na potrzeby tych prac wykonano 500 kursów betonowozów czyli popularnych „gruszek”. Dla lepszego obrazu skali przedsięwzięcia, można przyjąć, że ilości te, umożliwiłyby wypełnienie po brzegi basenu olimpijskiego betonem!

W listopadzie ukończono także ostatni strop nad częścią techniczną sali widowiskowej oraz attyki obwodowe. Rozpoczęto izolację kolejnych stropów w tym nad główną salą gdzie ułożono warstwę termoizolacji oraz papę. Natomiast wewnątrz rozpoczął się montaż

rusztowania przestrzennego, które umożliwi pracę nad niezbędnymi instalacjami na wysokości ponad 10m.

Na parterze rozpoczął się montaż konstrukcji aluminiowej dla pozostałych fragmentów fasady szklanej. Wokół budynku zrealizowano następną etap robót ziemnych. Było to wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego cementem dla obiektów małej architektury oraz drogi, która umożliwi przyszły wjazd z ulicy Władysława Jagiełły. Zakończono również kształtowanie wielkiego nasypu od wschodniej strony budynku głównego.

Przed budowlą zima i krótka, aczkolwiek ważna dla wszystkich pracowników przerwa świąteczno-noworoczna. Teraz większość prac będzie kontynuowana wewnątrz nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury i z zewnątrz na pierwszy rzut oka nie będzie widać większych zmian.

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)
