


Data publikacji

09 lutego 2023

Autor

Administrator

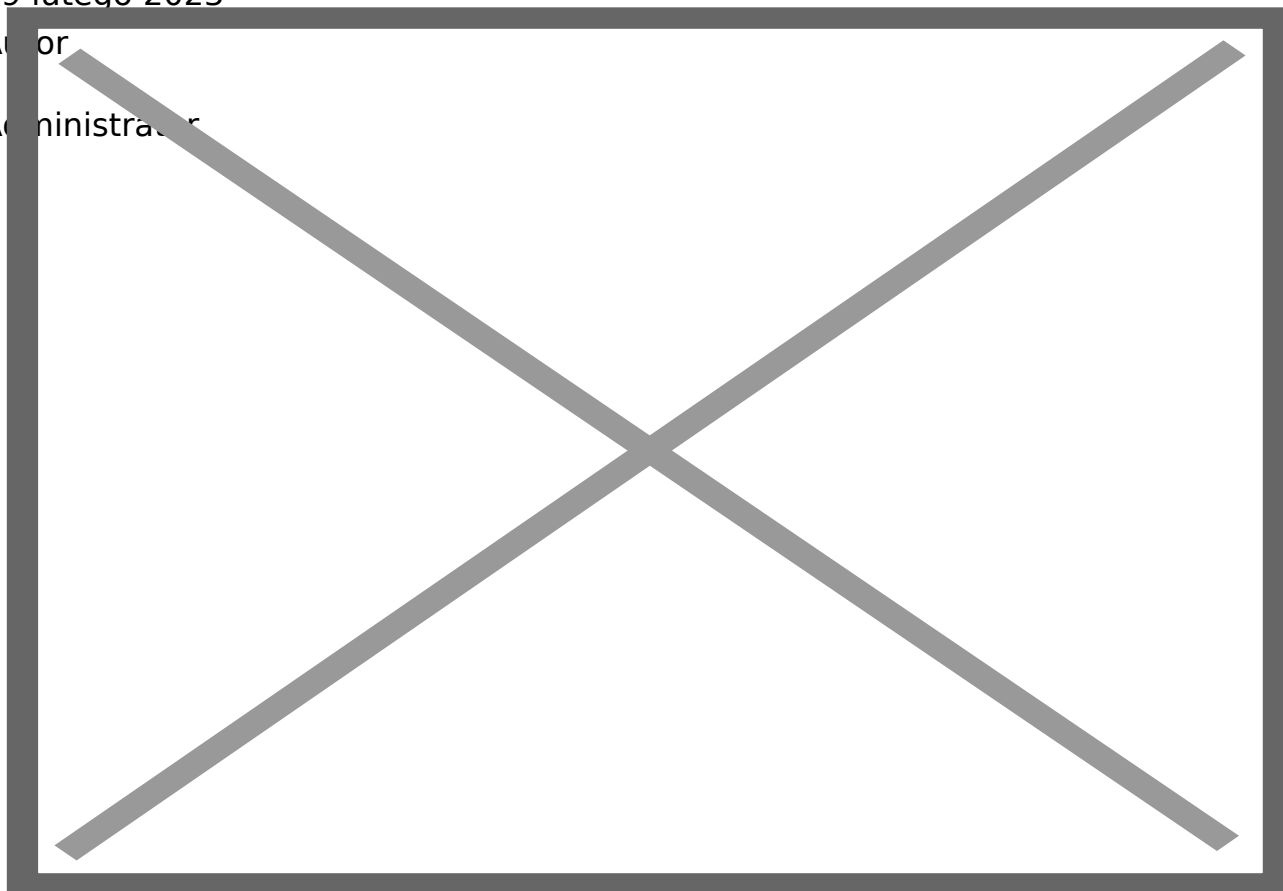

Kapryśny styczeń postawił wysoką poprzeczkę budowlańcom. Liczne deszczowe dni i pokrywa śnieżna nie ułatwiały zadań związanych z budową nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury. Wytrwale jednak kontynuowano rozpoczęte prace.

Zamontowano i sprefabrykowano liczne kanały wentylacyjne, które w niedługim czasie umożliwią uruchomienie wentylacji mechanicznej w obiekcie. Wykonano następny etap oprzewodowania dla klimatyzacji w pomieszczeniach. Znaczny postęp nastąpił w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gdzie rozprowadzono podejścia dla urządzeń sanitarnych, hydrantów i rozdzielaczy centralnego ogrzewania.

W trakcie ostatnich dni miesiąca rozpoczęto prace przy posadzkach i ogrzewaniu podłogowym. Prace dekarские zbliżają się już ku końcowi. W styczniu zakończono izolację

dachu nad salą widowiskową i rozpoczęto izolację ostatniego stropu. Zamontowano również balustradę na stropie skrzyńkowym, która oddzieli część użytkową od części niedostępnej dla gości.

Nad główną salą nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury rozpoczęto okablowanie dla przyszłego oświetlenia, nagłośnienia i sterowania dla techników sceny. Na parterze natomiast wykonano szklenie pozostałej fasady, która ciągnie się przez trzy elewacje budynku, stanowi główne wejście do obiektu i zamyka część foyer.

Kontynuowano także izolacje sali głównej od wewnątrz, które pozwolą na uzyskanie projektowych wymagań akustycznych. W łazienkach powstały stelaże dla zabudowań z płyt gipsowo-kartonowych. Zakończono tynkowanie ścian parteru i rozpoczęto prace na pierwszym piętrze.

Mimo zimowej, trudnej dla budowy aury, pracownicy z optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Wszyscy czekają na moment gdy na deskach sali widowiskowej pojawią się pierwsi artyści, kino wyświetli swój pierwszy film, a sale warsztatowe i taneczne będą gościć najmłodszych mieszkańców regionu, którzy będą szlifować swój artystyczny warsztat.

Tagi

[PCKul](#)

[Wszystkie aktualności](#)
