


Data publikacji

02 maja 2023

Autor

Administrator

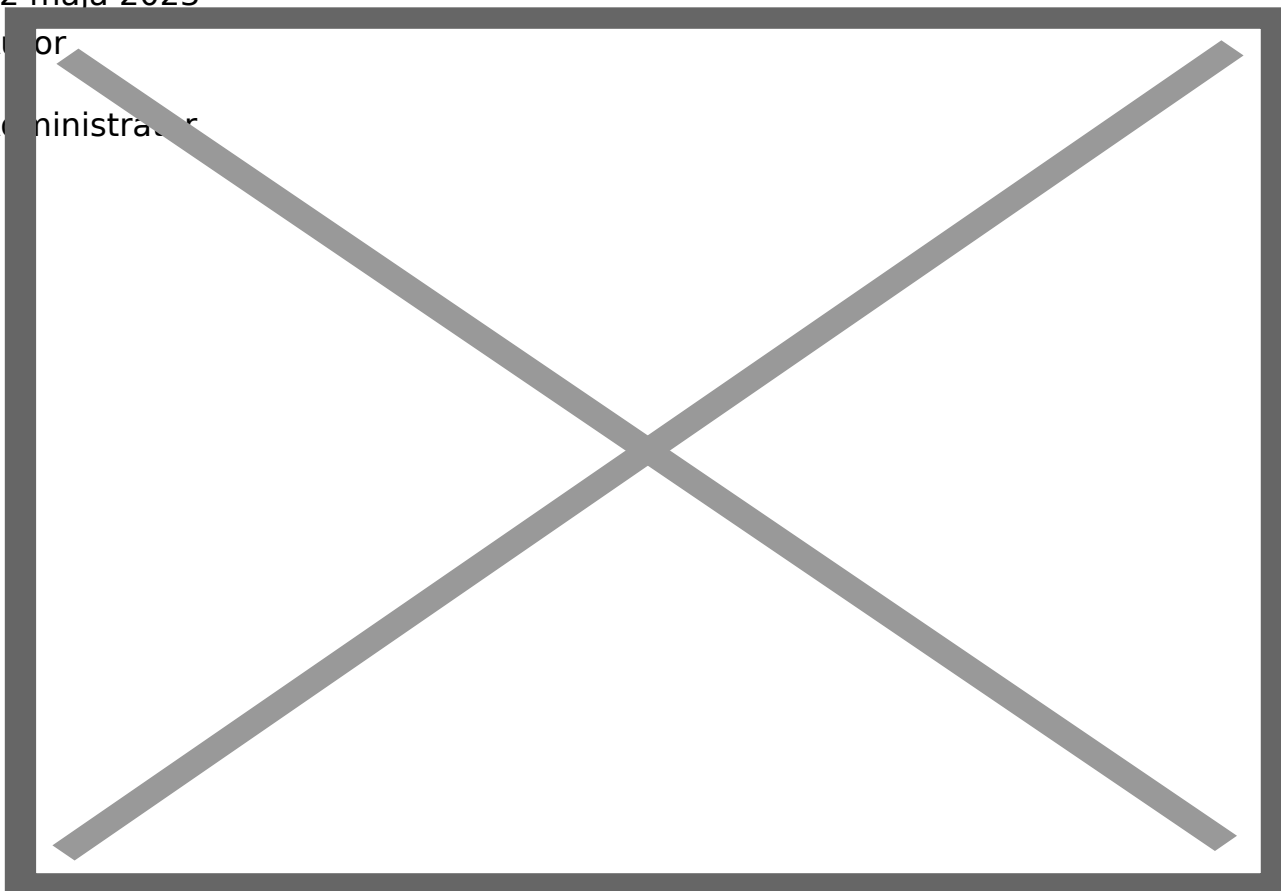

Na budowie Pszczyńskiego Centrum Kultury prace budowlane przyspieszają tempa. Od strony ul. Bielskiej ukazała się gotowa szklana fasada zamykająca górne foyer.

Zdemontowane rusztowanie przestrzenne wewnątrz budynku odsłoniło gotowy sufit z płyt akustycznych nad widownią Sali widowiskowej oraz pozwoliło rozpocząć prace związane z wykonaniem posadzki, gdzie na najniższych poziomach widowni oraz sceny wykonano podkład cementowy pod parkiet. Przed wykonaniem jastrychów cementowych na Sali widowiskowej ułożono ostatnie brakujące metry przewodowania technicznego oraz izolację z twardych płyt z wełny mineralnej.

W sumie, w całym budynku, ułożono bez mała 12 kilometrów przewodów nagłośnienia i sterowania dla techników sceny. Prace wykończeniowe kontynuowane są w Sali kinowej,

gdzie do żelbetowej konstrukcji stropu zamocowano płyty z wełny mineralnej z czarnym welonem a w przegłębieniach płyty fundamentowej ułożono kolejne metry kanałów wentylacyjnych ze sprasowanej wełny mineralnej. We foyer oraz w pomieszczeniach sanitarnych na parterze wykonano pierwsze zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Prace wykończeniowe przeniosły się również na pierwsze i drugie piętro, gdzie: wykonano tynki na ścianach, ułożono podposadzkową instalację centralnego ogrzewania i wykonano jastrychy cementowe w kolejnych pomieszczeniach. Zamontowano także kanały wentylacji mechanicznej oraz instalację wodnokanalizacyjną oraz instalację ciepła technologicznego dla zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Prace zewnętrzne przebiegają równie sprawnie co roboty wewnątrz nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury. W terenie ułożono dużą część kabli pod zasilanie latarni oświetleniowych.

Od strony ul. Bielskiej ukazała się gotowa szklana fasada zamykająca górne foyer. Natomiast od strony ul. Jagiełły, zamontowane na ścianach fasadowe, białe, wykonane z włókno-cementu płyty z frezowanym wzorem. Ustawione pod koniec ubiegłego miesiąca rusztowania pozwoliły wykonać termoizolację oraz stelaż pod płyty elewacyjne na ścianie od strony południowo-wschodniej oraz zamontować podkonstrukcję kolejnych świetlików nad schodami prowadzącymi z pierwszego na drugie piętro. Prace dekarские związane z ułożeniem warstw hydro i termoizolacji wykonywane są już na niewielkim fragmencie stropu skrzynekowego nad foyer.

Po deszczowym kwietniu przychodzi maj, który miejmy nadzieję przyniesie słoneczną pogodę. Ta pozwoli wykonać kolejne prace, które przyspieszają nas do otwarcia nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury.

[Wszystkie aktualności](#)
